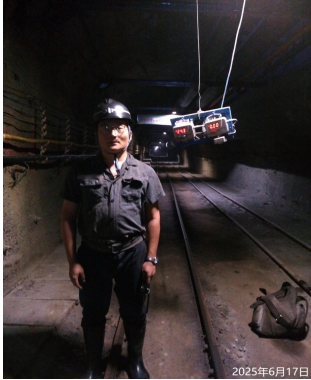
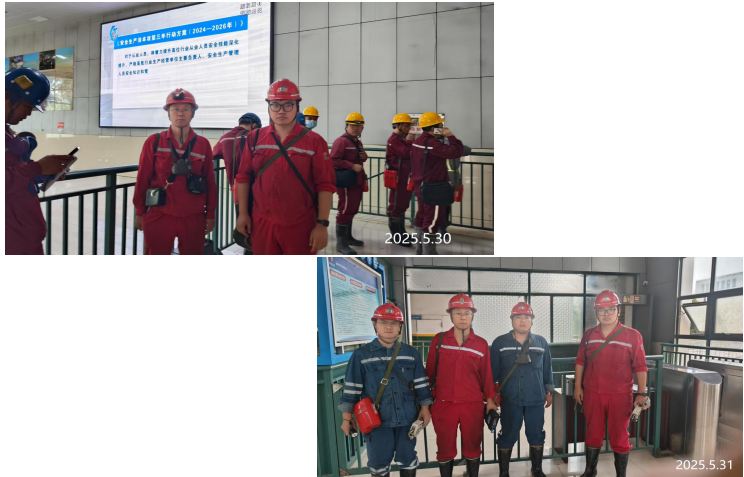
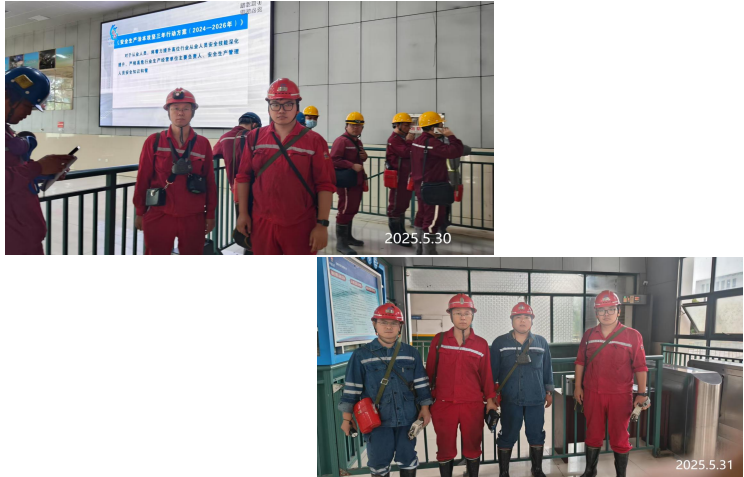


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1371/21-9-25027	2025年6月20日	存在问题： -320m炸药库回风巷二氧化氮传感器故障报警未及时处置。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	   
34	GX-B1371/21-9-25028	2025年6月20日	存在问题： 未打印报警记录月报表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 

35	GX-B1370/21-9-25014	2025年6月20日	存在问题： 安全监控设备使用情况月报中缺少开停传感器信息。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
36	GX-B1342/21-9-25005	2025.6.23	1. 矿井总进风量： 5351.9m³/min; 2. 矿井总回风量： 5179.3m³/min; 3. 全系统计算阻力值：1215.5Pa; 4. 全系统测定阻力值：1174.9Pa; 5. 矿井等积孔： 3.06m²。	

37	GX-B1341/24-9-25086	2025.6.23	综合判定：合格。	
38	GX-B1341/24-9-25087	2025.6.23	综合判定：合格。	

39	GX-B1343/21-9-25033	2025. 6. 24	1. 矿井总进风量：15460.1m³/min，矿井总回风量：15557.3m³/min； 2. 主通风机风量：15980.4m³/min； 3. 矿井有效风量：10680.4m³/min； 4. 矿井有效风量率：66.8%； 5. 机站风量：吴集-250m水平北风井通风机组8892.0m³/min；吴集-325m水平南风井通风机组7088.4m³/min； 6. 机站风压：吴集-250m水平北风井通风机组793Pa；吴集-325m水平南风井通风机组815Pa； 7. 矿井通风阻力：吴集北风井通风系统757.0Pa；吴集南风井通风系统784.3Pa。	
40	GX-B1347/21-9-25025	2025. 6. 24	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率66.8%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率率平均值73.4%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标88.8%，大于72%，合格。	

41	GX-B1343/21-9-25032	2025.6.23	1. 矿井总进风量：24973.6m³/min，矿井总回风量：26074.0m³/min； 2. 主通风机风量：26203.9m³/min； 3. 矿井有效风量：18181.0m³/min； 4. 矿井有效风量率：69.4%； 5. 机站风量：李楼北风井通风机组14614.5m³/min；24线南措施井主通风机6096.0m³/min；24线北措施井主通风机5493.4m³/min； 6. 机站风压：李楼北风井通风机组1710Pa；24线南措施井主通风机1590Pa；24线北措施井主通风机1344Pa； 7. 矿井通风阻力：李楼北风井通风系统1508.4Pa；24线南措施井通风系统1485.6Pa；24线	
42	GX-B1347/21-9-25024	2025.6.23	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率69.4%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率平均值71.4%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标89.0%，大于72%，合格。	

43	GX-B1343/21-9-25034	2025.6.26	1. 矿井总进风量： 4015.4m3/min，矿井总回风量：4096.5m3/min； 2. 主通风机风量： 4184.7m3/min； 3. 矿井有效风量： 3002.5m3/min； 4. 矿井有效风量率：71.7%； 5. 通风机负压：912Pa； 6. 矿井通风阻力：850.9Pa。	 2025.5.29
44	GX-B1341/24-9-25091	2025.6.27	综合判定：合格。	 2025.6.20

45	GX-B1343/21-9-25038	2025.6.27	1. 矿井总进风量：70.58 m³/s；矿井总回风量：81.45 m³/s； 2. 主通风机风量：84.10 m³/s； 3. 矿井有效风量：61.87 m³/s； 4. 矿井有效风量率：73.6%； 5. 机站风量：北风井主通风机 56.77 m³/s，+5m风井通风机 27.33 m³/s； 6. 通风机负压：北风井主通风机845 Pa； 7. 矿井通风阻力：838.2 Pa。	
46	GX-B1347/21-9-25027	2025.6.27	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率73.6%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率值73.9%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.56，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标 90.3%，大于72%，合格。	

47	GX-B1425/23-9-25010	2025.6.27	1. 矿井进风风量：70.58 m3/s； 2. 矿井反风风量：43.75 m3/s； 3. 机站正常通风风量：北风井风机56.77 m3/s，+5m风井风机27.33 m3/s； 4. 机站反风风量：北风井风机36.80 m3/s，+5m风井风机18.43 m3/s； 5. 机站反风率：北风井风机64.82%，+5m风井风机67.44%； 6. 矿井风流反向用时：8分52秒。	
----	---------------------	-----------	--	--
